



Липецкая
область

ПРОЕКТ
«Оптимизация процесса подготовки к совместным мероприятиям
ДОУ и школы»

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №126 г. Липецка**

2023 г.



Тема проекта: «Оптимизация процесса подготовки к совместным мероприятиям ДОУ и школы»

СОГЛАСОВАНО

Председатель департамента образования
администрации города Липецка

_____ С.В. Бедрова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая ДОУ № 126 г. Липецка

_____ О.А. Белоусова

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СШ № 2 г. Липецка

_____ К.В. Иванов

Тема: «Оптимизация процесса подготовки к совместным мероприятиям ДОУ и школы»

<u>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</u> 1. <u>Заказчик проекта</u>: заведующая ДОУ Белоусова О.А. 2. <u>Владелец процесса</u>: заведующая ДОУ Белоусова О.А., Иванов К.В. 3. <u>Название процесса</u>: подготовка к совместным мероприятиям детского сада и школы 4. <u>Границы процесса</u>: от создания совместного плана работы по преемственности ДОУ и СОШ до проведения мероприятия 5. <u>Руководитель проекта</u>: заведующая ДОУ О.А. Белоусова 6. <u>Команда проекта</u>: Долгополова М.В., педагог - психолог Долматова Е. А., воспитатель Сьянова О.И., учитель начальных классов Федянина А.Е., заместитель директора			<u>2. Обоснование выбора</u> Разработка проекта вызвана: 1. Удаленность школы и детского сада 2. Отсутствие универсального плана подготовки к совместным мероприятиям 3. Большие затраты времени воспитателей и учителей во время очного проведения подготовки к совместным мероприятиям											
<u>3. Цели и плановый эффект</u> <table><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>1.Сокращение временных затрат воспитателей и учителей при подготовке к совместным мероприятиям, мин</td><td>310-530</td><td>55-105</td></tr><tr><td>2.Удовлетворенность проведением совместных мероприятий, %</td><td>15</td><td>75</td></tr></table> Эффекты: 1. Сокращение временных затрат на подготовку к совместным мероприятиям 2. Разработка стандарта подготовки к совместным мероприятиям 3. Повышение удовлетворённости учителей и воспитателей к подготовке совместных мероприятий			Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1.Сокращение временных затрат воспитателей и учителей при подготовке к совместным мероприятиям, мин	310-530	55-105	2.Удовлетворенность проведением совместных мероприятий, %	15	75	<u>4. Ключевые события проекта</u> 1. Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения и учредителем с 01.03.2023 до 05.03.2023 2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса с 06.04.2023 до 10.03.2023 3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 11.03.2023 до 20.03.2023 4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 21.03.2023 до 25.03.2023 5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) с 26.03.2023 до 31.03.2023 6. Реализация плана мероприятий 01.04.2023 до 31.05.2023 7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов с 01.06.2023 до 30.06.2023 8.Заккрытие проекта 01.04.2023 9. Мониторинг стабильности результатов с 01.07.2023 до 31.07.2023		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель												
1.Сокращение временных затрат воспитателей и учителей при подготовке к совместным мероприятиям, мин	310-530	55-105												
2.Удовлетворенность проведением совместных мероприятий, %	15	75												

Вовлеченные лица и рамки проекта

Границы процесса: от создания совместного плана работы по преемственности ДОУ и СОШ до проведения итоговых мероприятий

Руководитель проекта: заведующая ДОУ О.А. Белоусова

Команда проекта:

- Долгополова М.В., педагог - психолог
- Долматова Е. А., воспитатель
- Сьянова О.И., учитель начальных классов
- Федянина А.Е., заместитель директора



Обоснование выбора



Разработка проекта вызвана:

1. Удаленность школы и детского сада
2. Отсутствие универсального плана подготовки к совместным мероприятиям
3. Большие затраты времени воспитателей и учителей во время очного проведения подготовки к совместным мероприятиям



Пути решения проблем:

1. Дистанционная подготовка к проведению совместных мероприятий.
2. Обсуждение плана совместных мероприятий с помощью подключения к платформе «Зум»
3. Разработка структуры подготовки совместных мероприятий в онлайн формате
4. Разработать совместный канал в мессенджере «Телеграмм» для оперативной информации и согласовании дат проведения мероприятий

ЦЕЛИ ПРОЕКТА



Создание оптимальной
модели подготовки
к совместным
мероприятиям
ДОУ и школы




Сокращение временных
затрат воспитателей и
учителей при подготовке
к совместным
мероприятиям



Удовлетворенность
проведением совместных
мероприятий

Ключевые события проекта

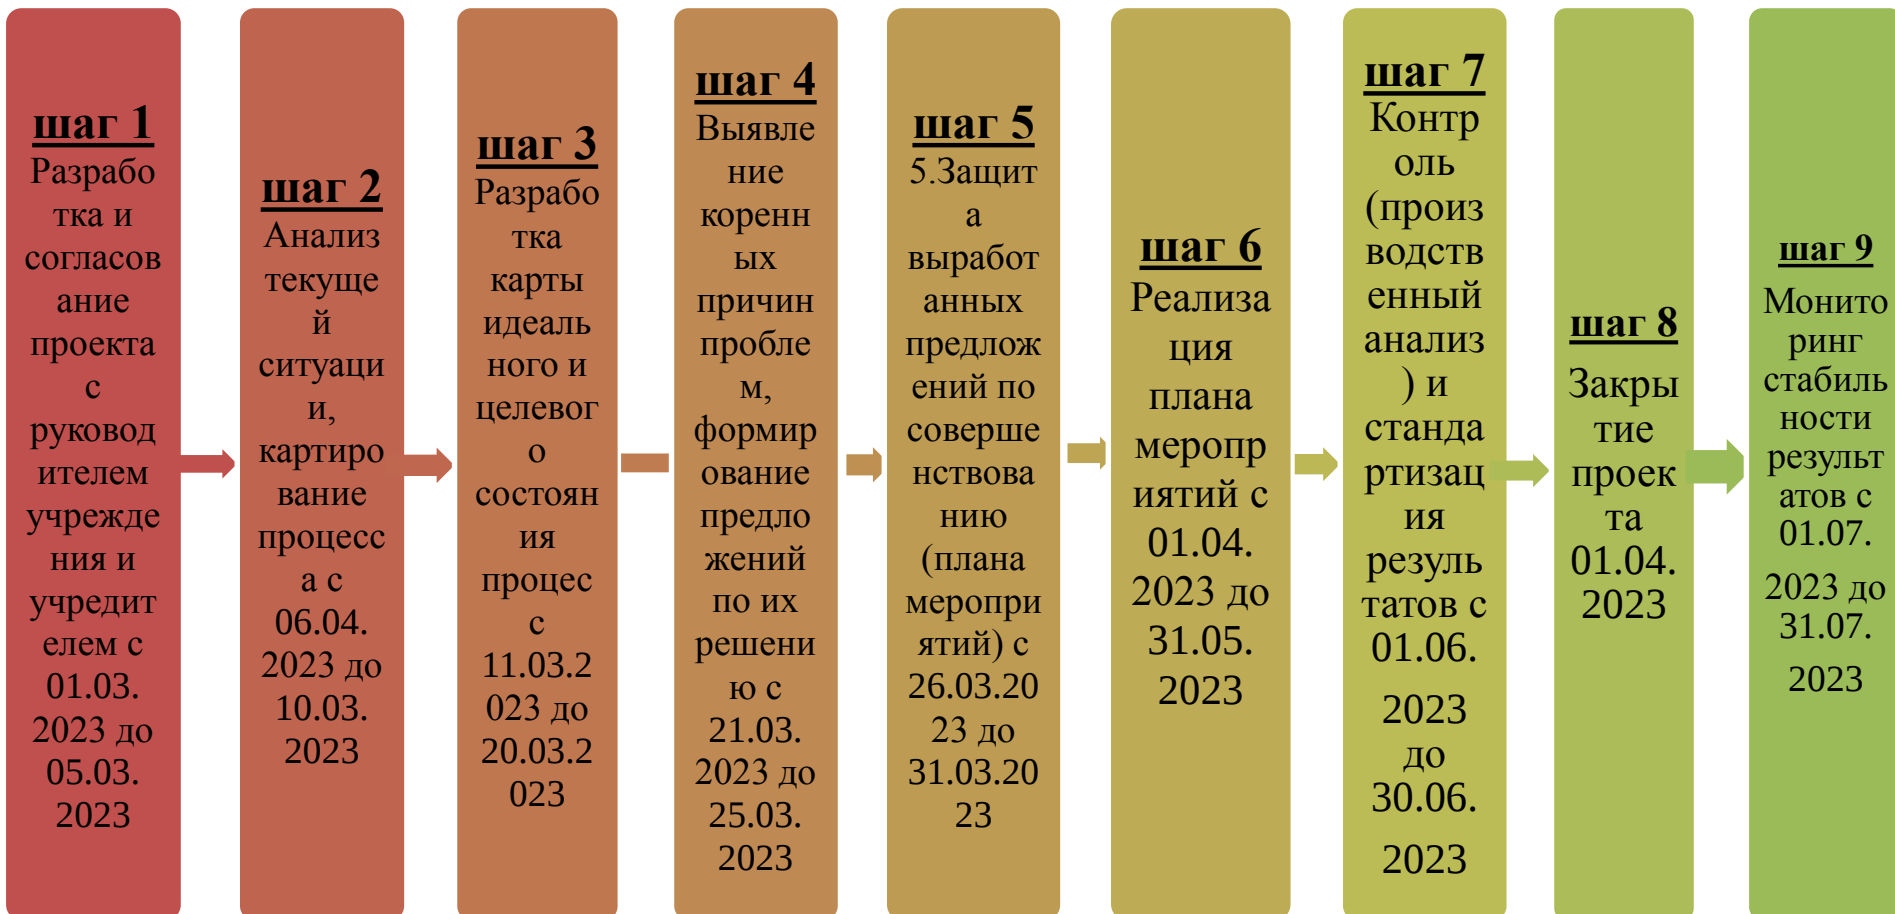

Введение в предметную область (описание ситуации «как было»)

Карта текущего состояния процесса

«Оптимизация процесса подготовки к совместным мероприятиям ДОУ и школы»

ВПП (время протекания процесса) - **310-530 мин**

ВХОД

Методист, ст. воспитатель ДОУ, зауч школы

Получают от руководителей поручение о составлении плана преемственности работы ДОУ и СОШ

10-20 мин

Воспитатели

Относят черновой материал старшему воспитателю

20-30 мин

Учителя

Относят черновой материал заучу по УВР

20-30 мин

1
Ст. воспитатель ДОУ

Идет в школу для обсуждения плана подготовки

20-40 мин

Ст. воспитатель ДОУ, зауч по УВР школы

Изучают вопросы по подготовке плана преемственности, определяют цели и формы работы

40-60 мин

Ст. воспитатель ДОУ, зауч по УВР школы

Подходит к каждому педагогу и дают задания воспитателям и учителям по разработке мероприятий

30-50 мин

Воспитатели

Разрабатывают черновой план мероприятий

40-60 мин

Учителя

Разрабатывают черновой план мероприятий (передвигаются по школе для обсуждения)

40-60 мин

Ст. воспитатель

Обсуждает с воспитателями план работы

30-60 мин

1
3
Старший воспитатель ДОУ, зауч школы

Встречаются, изучают подготовленные материалы, делают выводы, приходят к единому мнению и утверждают план работы

60-90 мин

1
3
Старший воспитатель ДОУ, зауч школы

Каждый раз встречаются для обсуждения подготовки мероприятий

40-60 мин

Старший воспитатель ДОУ, зауч школы, воспитатель, учитель

Проходят в школу или сад с воспитанниками или учениками для проведения мероприятия

30-50 мин

ВЫХОД

Выявленные проблемы

1

Удаленность школы и детского сада

2

Большие затраты времени воспитателей и учителей во время очного проведения подготовки к совместным мероприятиям

3

Отсутствие универсального плана подготовки к совместным мероприятиям

4


Отсутствие стандарта подготовки к совместным мероприятиям

5

Отсутствие связи между воспитателями и учителями

ДИАГРАММА ГАНТА

«Оптимизация процесса подготовки к совместным мероприятиям ДОУ и школы»

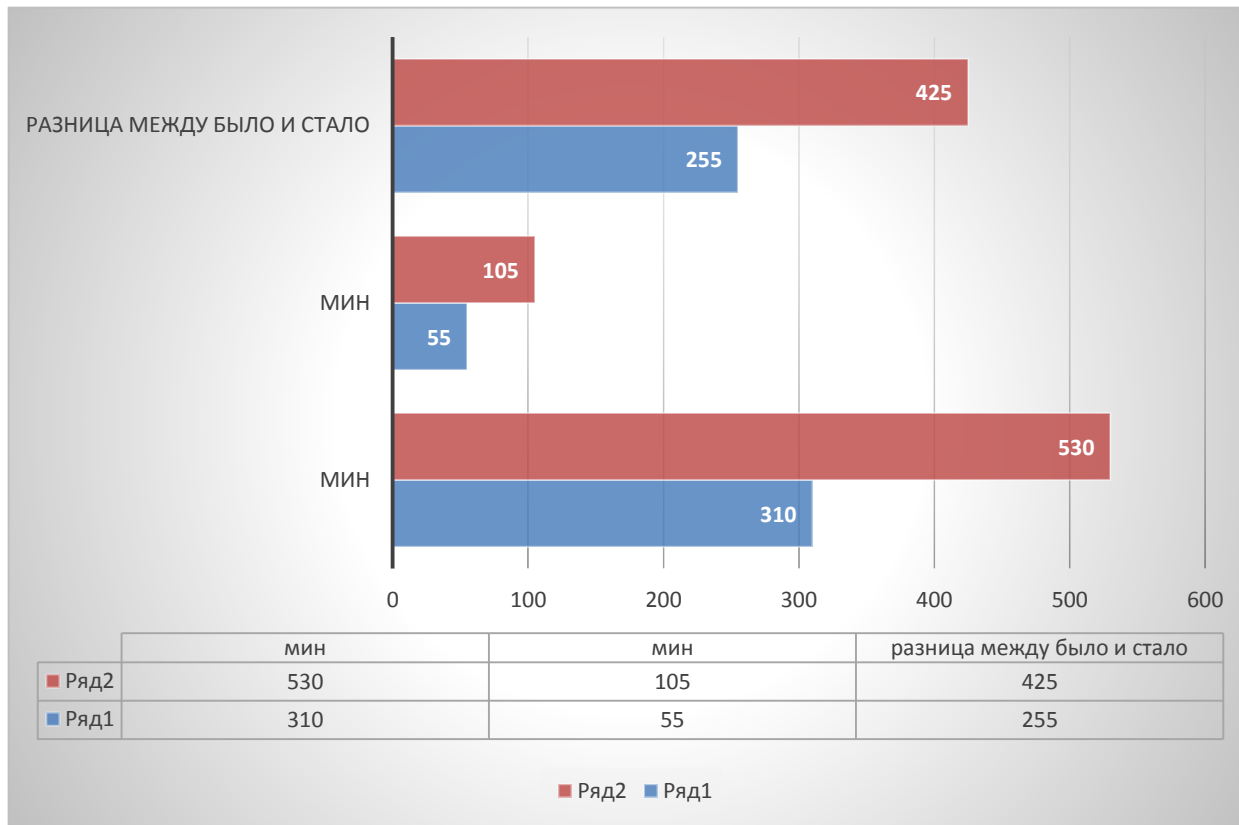

МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

«Оптимизация процесса подготовки к совместным мероприятиям
ДОУ и школы»



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Федеральный уровень – не выявлены

Региональный уровень – не выявлены

Отсутствие универсального плана подготовки совместных мероприятий

Отсутствие разработанного стандарта

Педагоги не владеют достаточной компетенцией о формах проведения совместных мероприятий

Подобранный материал не соответствует требованиям

Удаленность школы от детского сада

Уровень
ДОУ






Введение в предметную область (описание ситуации «как стало»)

Карта целевого состояния процесса

«Оптимизация процесса подготовки к совместным мероприятиям ДООУ и школы»

ВПП (время
протекания
процесса) -
55-105
мин


ВХОД

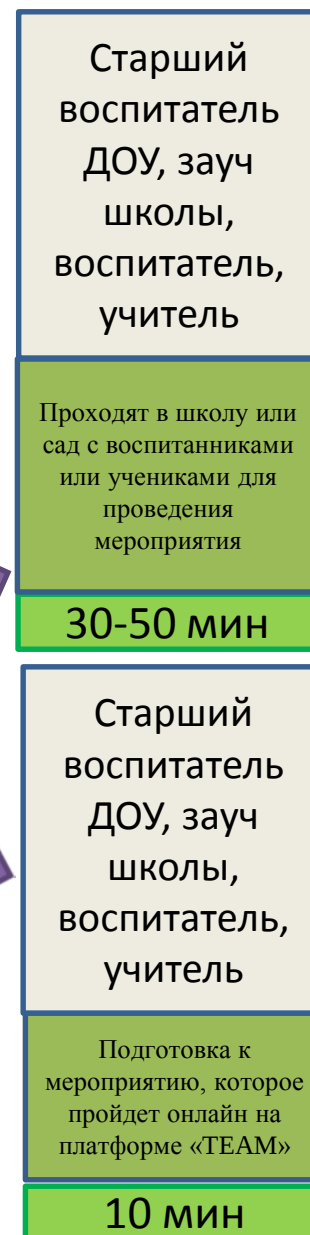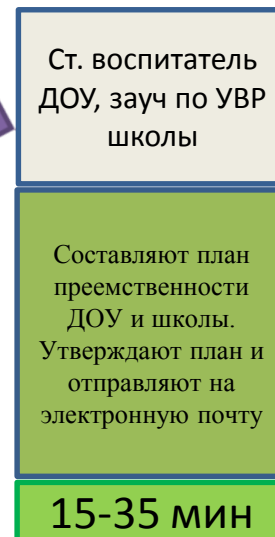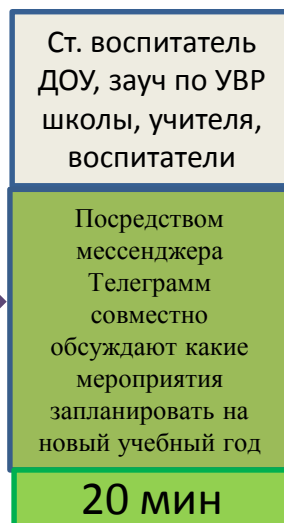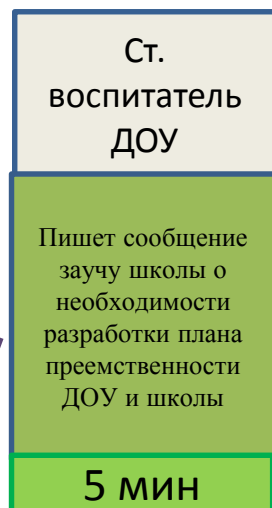

ВЫХОД

ГРАФИК СТАБИЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ


УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЕМ
МЕРОПРИЯТИЙ, %

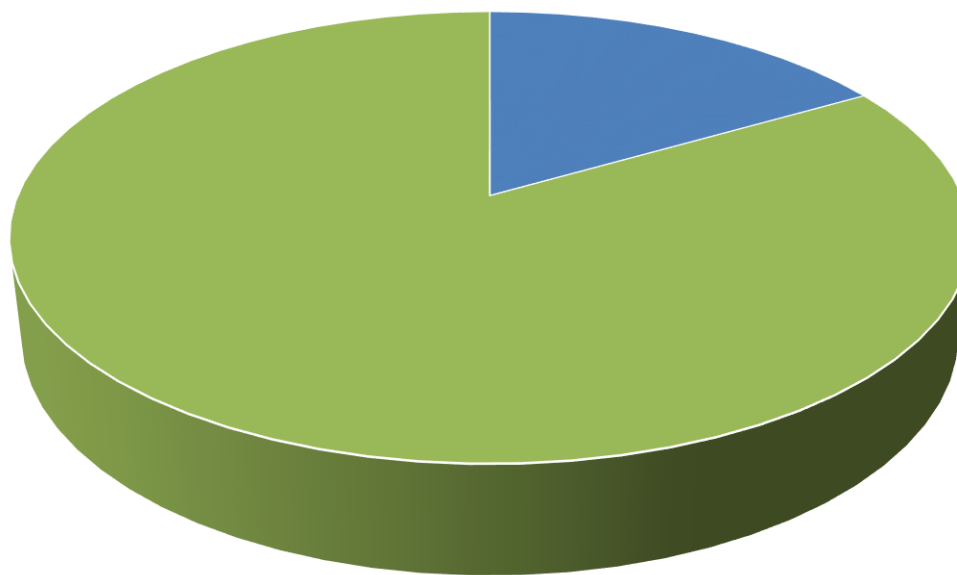

■ БЫЛО ■ СТАЛО ■ ■


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Оптимизация процесса подготовки к совместным мероприятиям ДОУ и школы

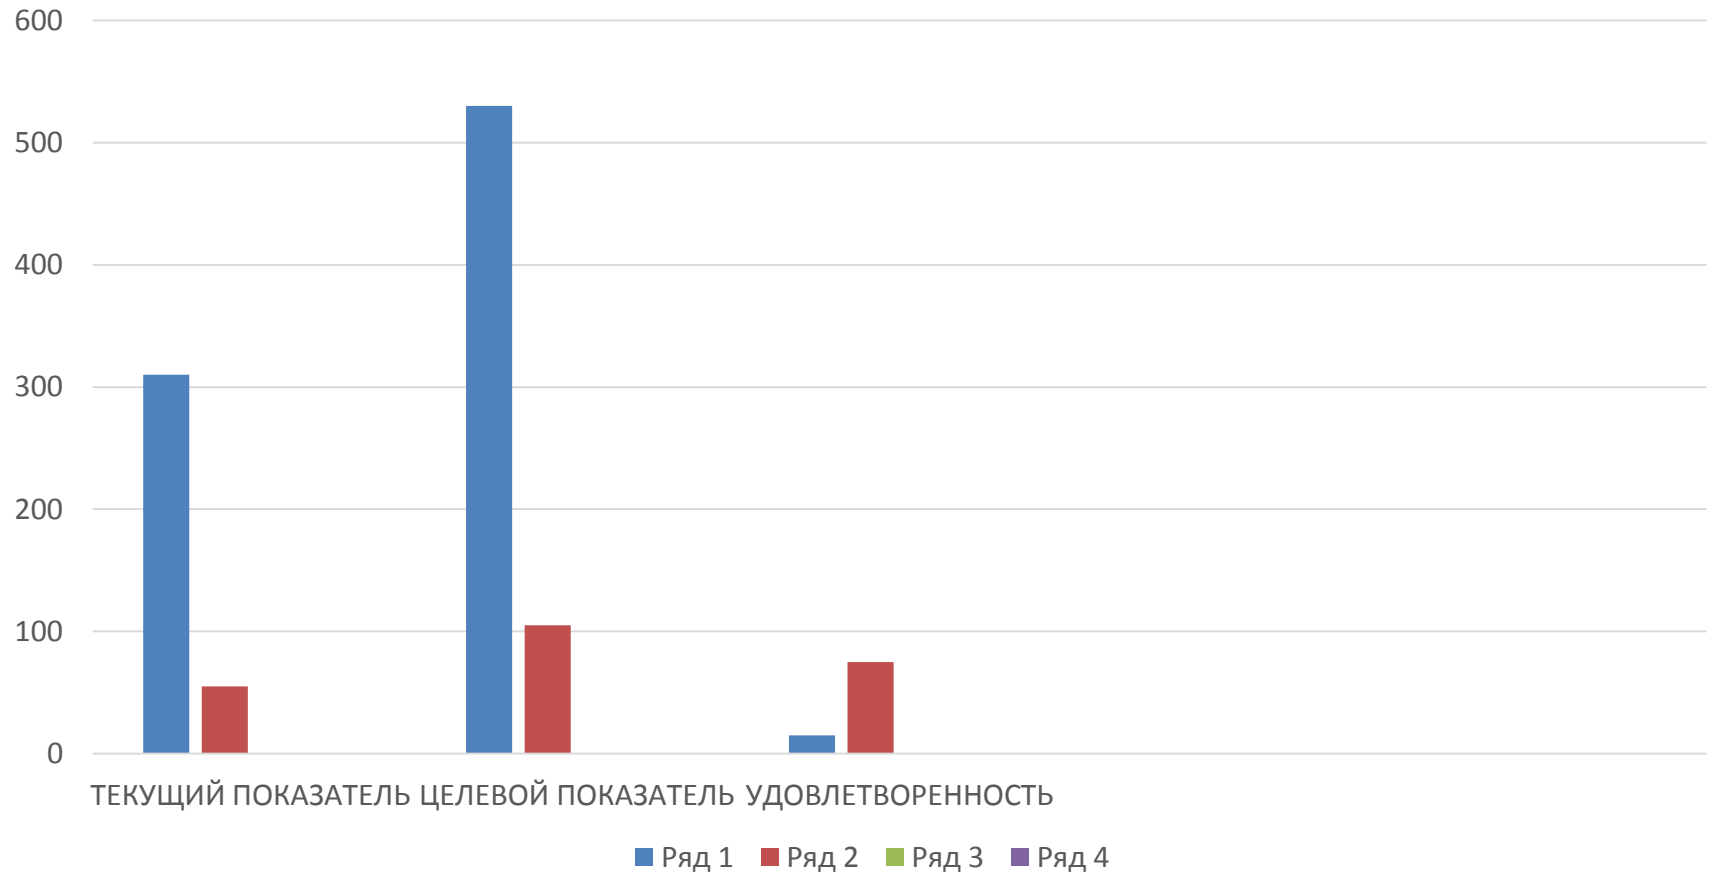

МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оптимизация процесса подготовки к совместным мероприятиям ДОУ и школы

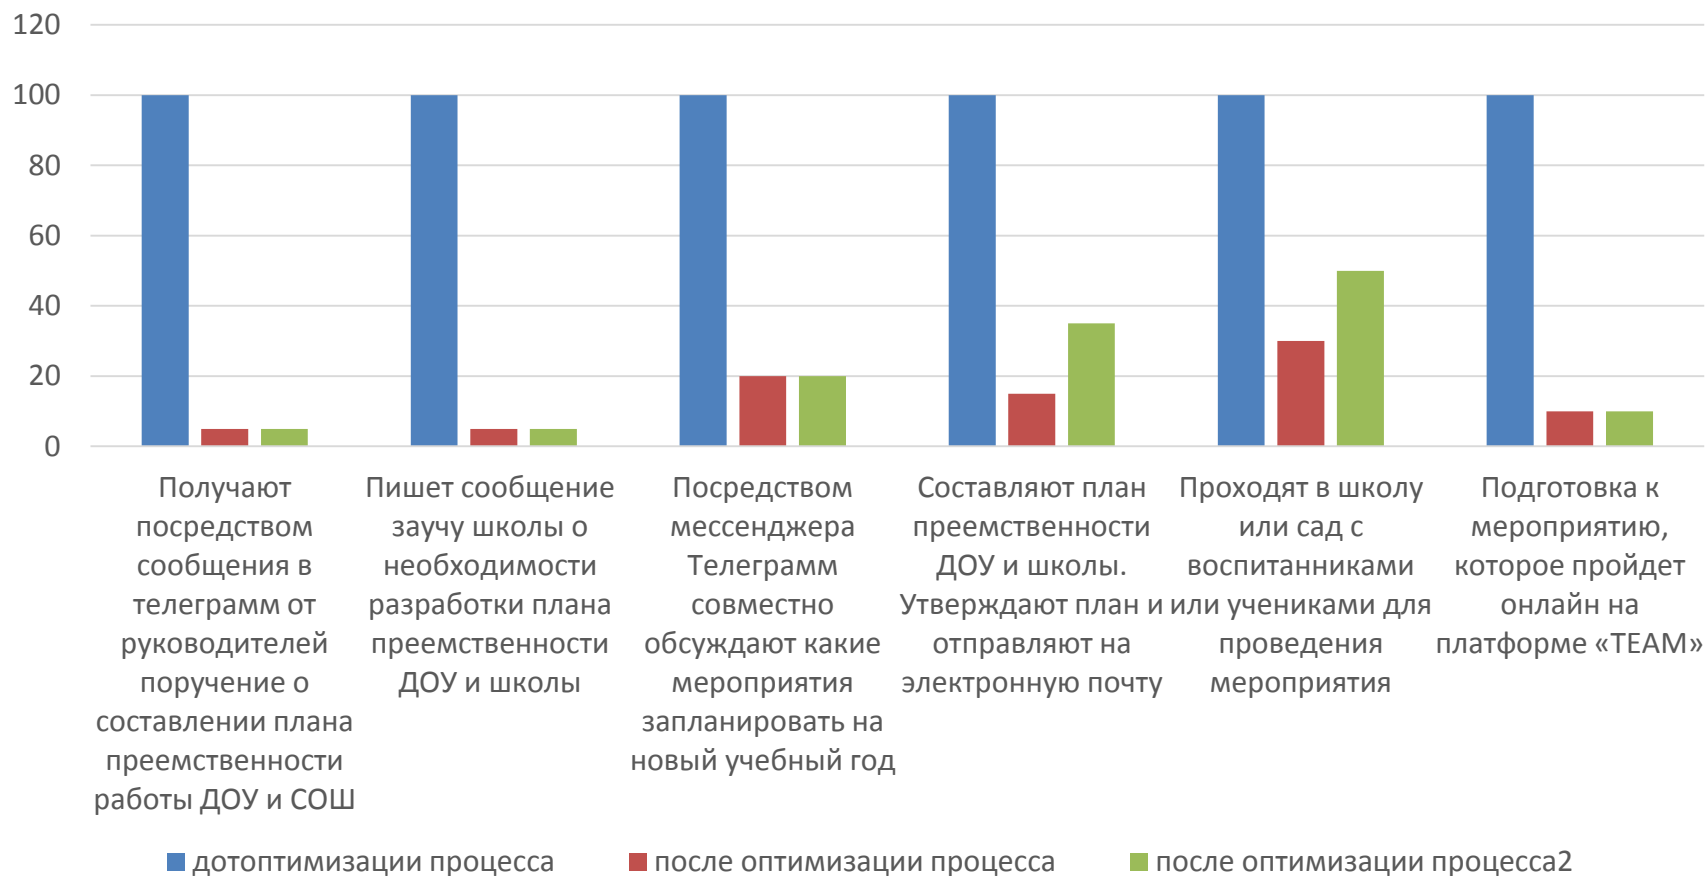






Введение в предметную область (описание ситуации «как стало»)

Карта идеального состояния процесса

«Оптимизация процесса подготовки к совместным мероприятиям ДООУ и школы»

ВПП (время
протекания
процесса) -
55-105
мин

ВХОД

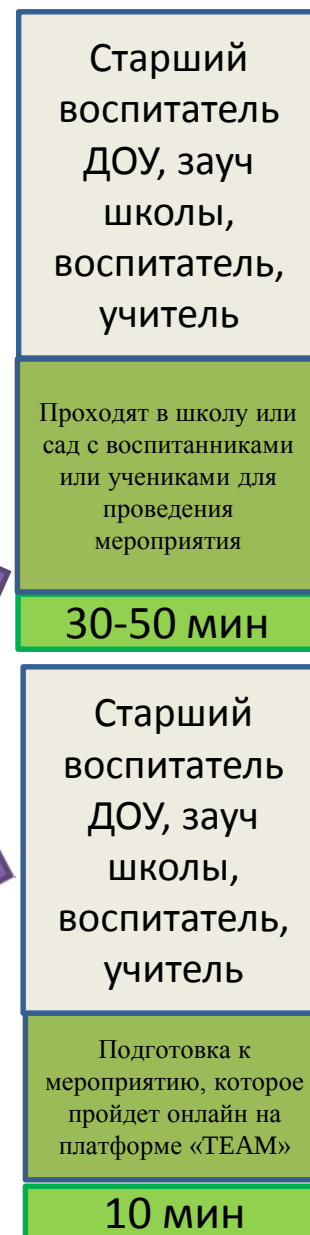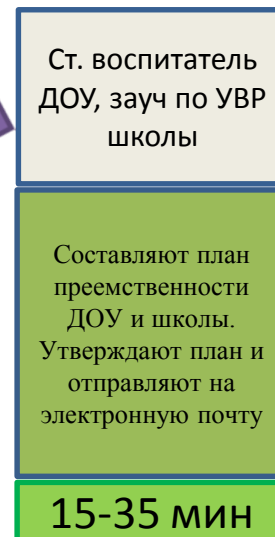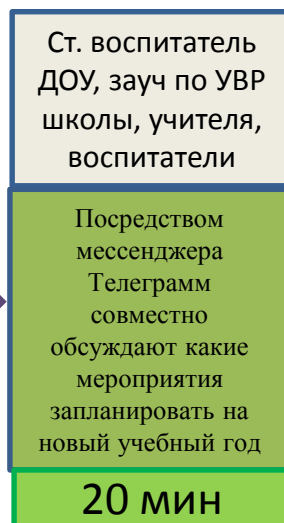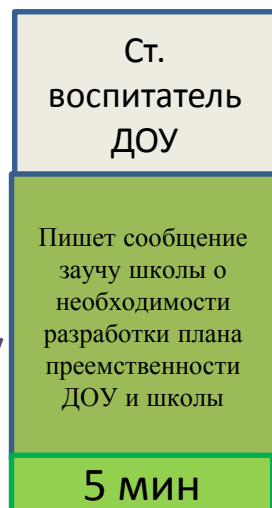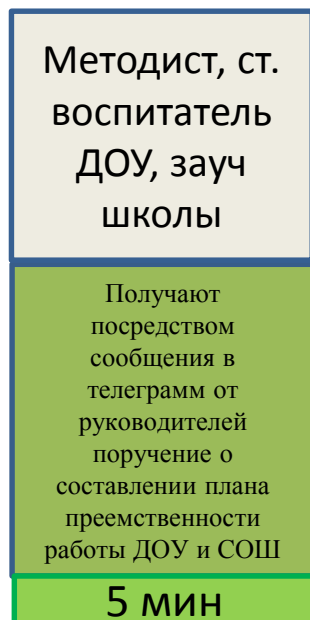

ВЫХОД

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

**Проведение очной
подготовки к
совместным
мероприятиям ДОУ
и школы**


**310-530
мин**

СТАЛО

**Проведение
дистанционной
подготовки к
совместным
мероприятиям ДОУ
и школы**

**55-105
мин**

Стандарты проекта

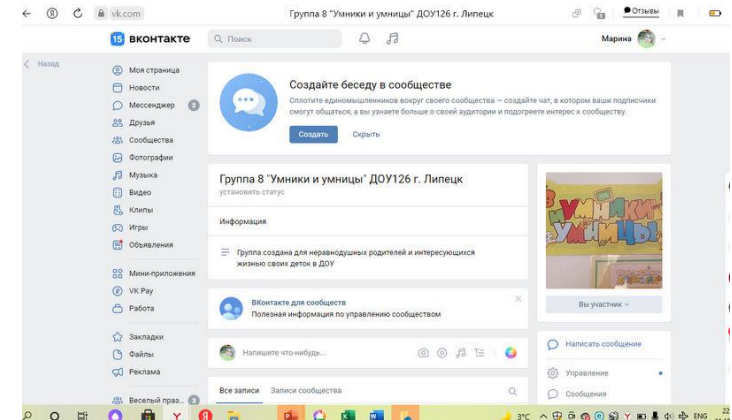

№	Вопрос	да	нет	не знаю
1	Вы в системе получаете информацию:			
2	о планах и целях учебного года в области обучения и воспитания Вашего ребенка;			
3	о режиме работы, выполняемых упражнениях (физ. работы, прогулки, спортивные игры);			
4	о системе питания;			
5	о дополнительных услугах, предоставляемых сообществу (консультации, консультации и т.д.);			
6	о состоянии здоровья Вашего ребенка (заболевания, травмы, аллергии, заболевания органов и систем);			
7	о состоянии здоровья Вашего ребенка (заболевания, травмы, аллергии, заболевания органов и систем);			
8	о состоянии здоровья Вашего ребенка (заболевания, травмы, аллергии, заболевания органов и систем);			
9	о состоянии здоровья Вашего ребенка (заболевания, травмы, аллергии, заболевания органов и систем);			
10	о состоянии здоровья Вашего ребенка (заболевания, травмы, аллергии, заболевания органов и систем);			
11	о состоянии здоровья Вашего ребенка (заболевания, травмы, аллергии, заболевания органов и систем);			
12	о состоянии здоровья Вашего ребенка (заболевания, травмы, аллергии, заболевания органов и систем);			
13	о состоянии здоровья Вашего ребенка (заболевания, травмы, аллергии, заболевания органов и систем);			
14	о состоянии здоровья Вашего ребенка (заболевания, травмы, аллергии, заболевания органов и систем);			
